

# 被害情報収集ハブ/新Lアラート運用への移行に関するご報告

2023年3月23日  
株式会社NTTデータ

## ◆本資料の目的

Lアラートの運用を、情報収集ハブ/新Lアラート運用への切換えを実施しました。

都道府県システムの消防庁被害情報収集ハブへの切替は、3月7日以降22日までにすべて完了しております。

移行の実施状況並びに、運用開始後の一部事象への対応等についてご説明いたします。

# 移行切替について【再掲：前回説明】

構築済  
(試験中)

## ◆切替順序概要①

被害情報収集ハブと新Lアラートを構築し、現行Lアラート環境に発信する仕組みを作る。




# 移行切替について【再掲：前回説明】

3/6週  
(予定)

## ◆切替順序概要②

一定の移行期間の間に県防災システムを順次移行し、移行完了後はそのまま被害情報収集ハブに発信。その情報は現行Lアラートに連携され、これまで通り現行Lアラートから、情報伝達者に連携する。

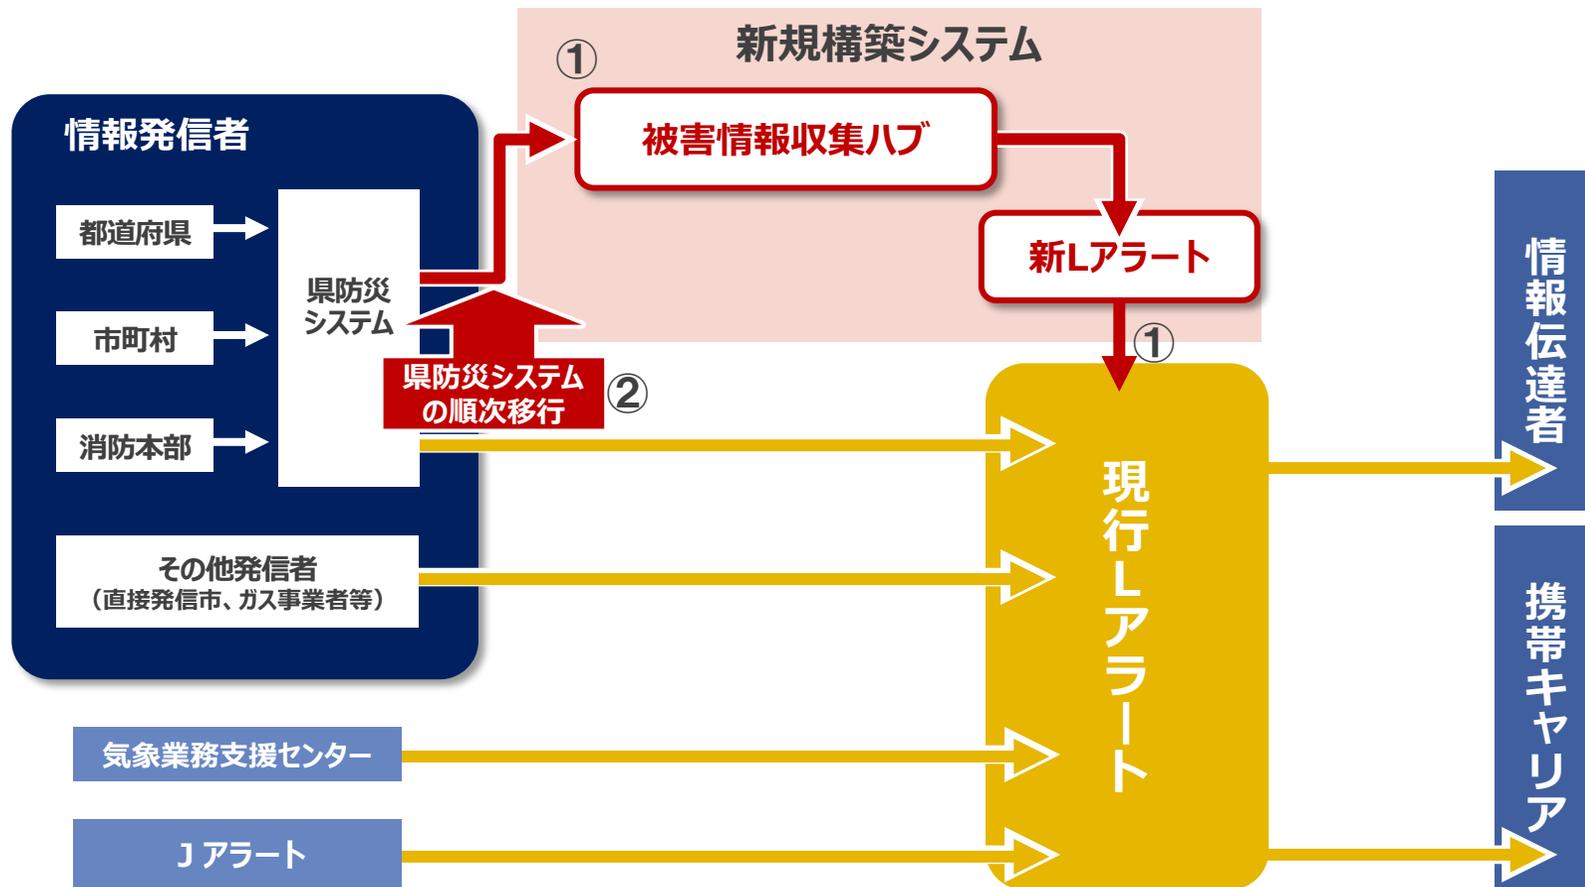


# 移行切替について【再掲：前回説明】

3/6週  
(予定)

## ◆切替順序概要③

すべての県防災システムの移行が完了する。

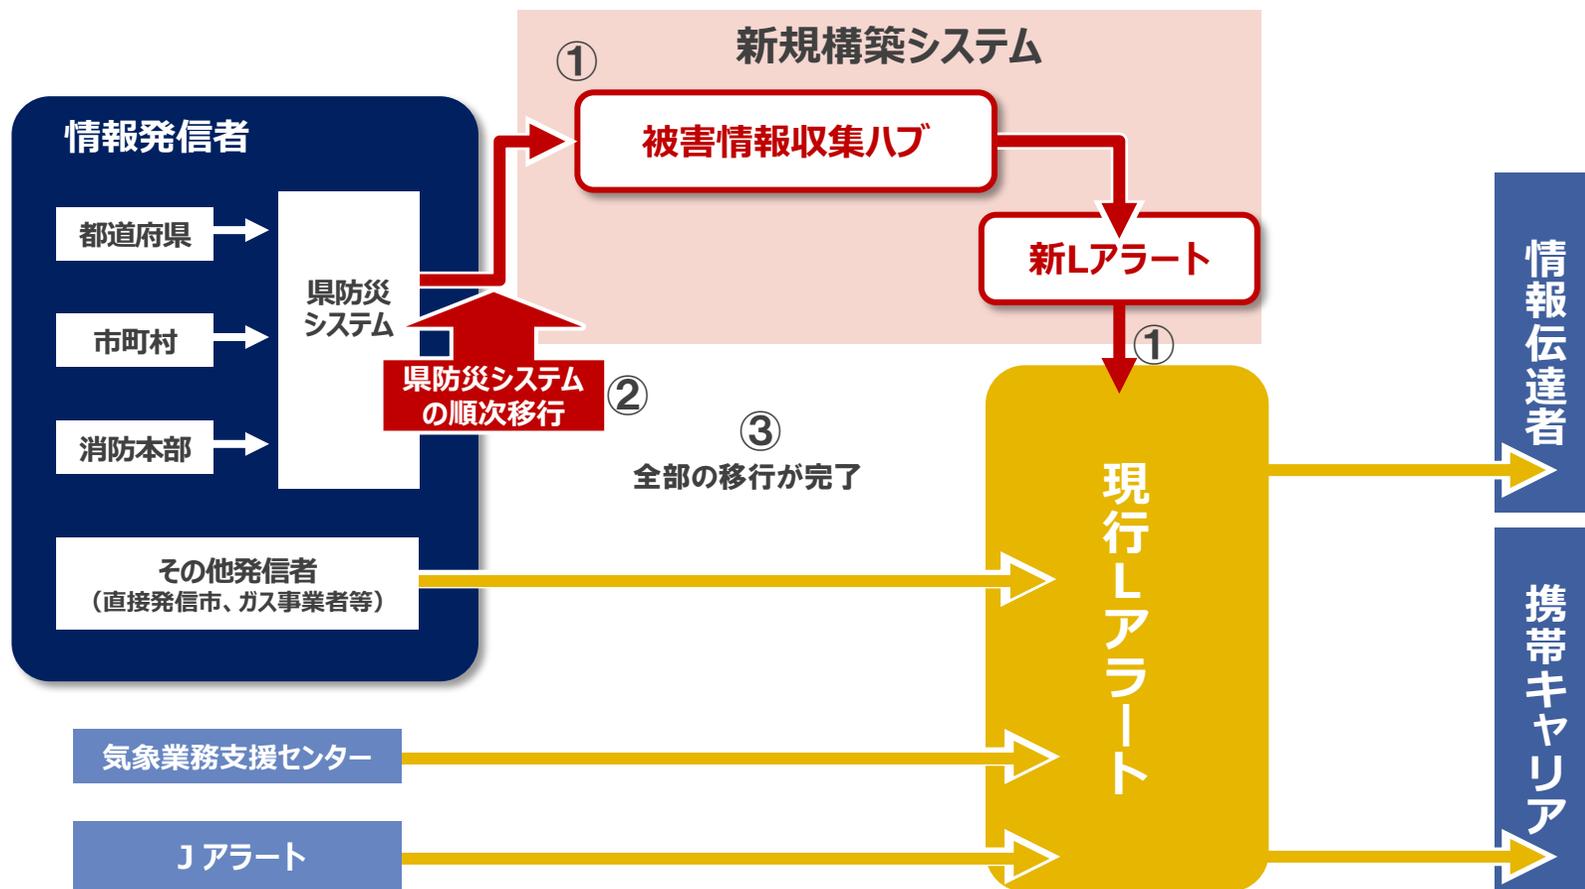


# 移行切替について【再掲：前回説明】

3/13(月)  
(予定)

予備日:3/20(月)・3/22(水)

## ◆切替順序概要④

現行Lアラートの設定情報を同一にした新Lアラートに切り替える。  
移行日当日、利用者は現行Lアラートへの接続設定を変更する必要はありません。  
(移行日までの利用者での事前準備が必要な場合を除く)

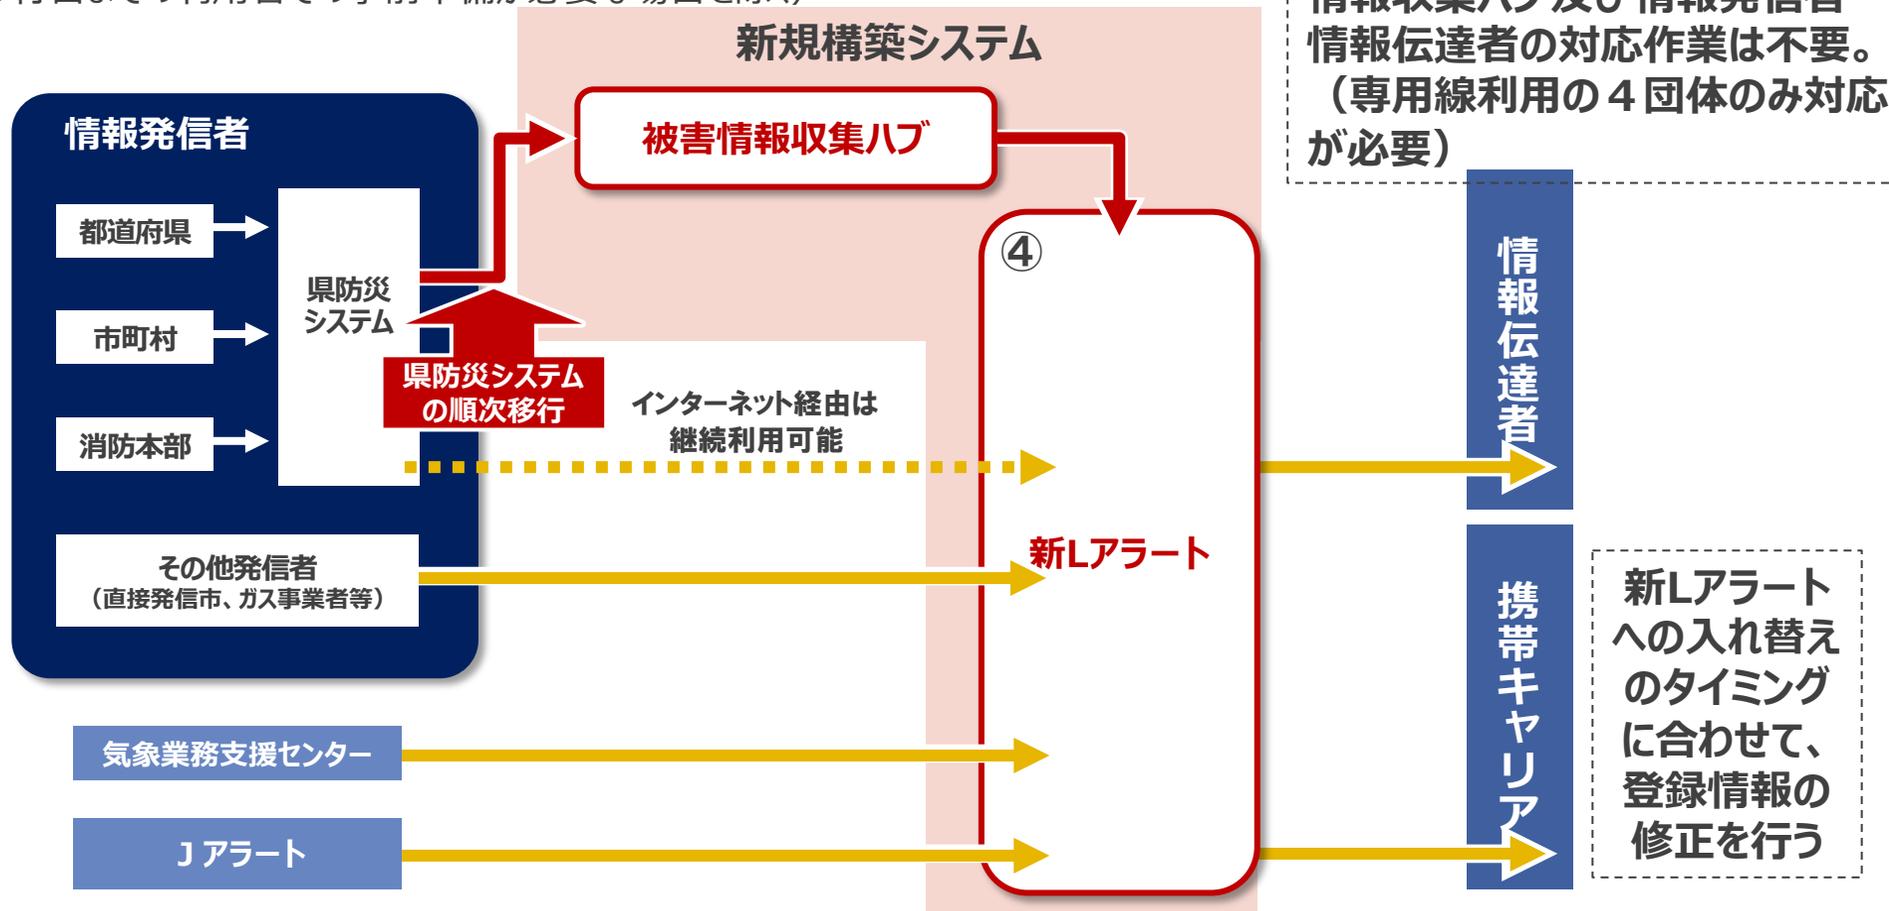

# 移行スケジュール（予定）

## ◆ 移行スケジュール概要

3月の各種移行スケジュールを下記に示します。

項番	試験名称	目的
①	被害情報収集ハブ移行	県防災システムを被害情報収集ハブへ移行する。
②	新Lアラート移行	現行Lアラートの設定情報を引継、新Lアラートに切り替える。
③	携帯キャリア移行 （※次ページ補足）	緊急速報メールについて、新Lアラート移行後から随時現行Lアラートから新Lアラートへ切り替える。

### 移行スケジュール

Lアラート移行実施日

Lアラート移行予備日①

Lアラート移行予備日②



# 移行スケジュール（実績）

## ◆移行スケジュール（実績）



## ◆都道府県の消防庁被害情報収集ハブへの移行について

- ・都道府県システムの消防庁被害情報収集ハブへの切替は、3月7日以降22日までにすべて完了した。

## ◆緊急速報メールの携帯キャリアのIP登録について

- ・3/13にKDDI・ソフトバンク・楽天はIP切換えが完了。新Lアラートから接続確認完了。
- ・ドコモについては、3/13の切換え予定の4自治体分切換え完了。接続確認済み。  
5月中旬にかけて日々切換えを実施し、完了予定は5/11（木）の見込み

## 3/13の移行に関する報告

### ◆移行作業について

- ・予定していた作業は無事完了。
  - DNSの切換え、WVS利用者の切換え、携帯キャリア様のIP切換えなど、問題なく実施完了
- ・緊急速報メールのキャリアIP登録について、一部のキャリアで旧アドレスの削除ができていない事象発生
  - 翌日までにキャリアに対処要請、対処済み。

### ◆移行後の問い合わせ対応状況について（3/20時点の状況）

- ・2 利用者から気象情報が一部表示されないという申告あり。
  - 版数が1から振られる場合、更新されないという事象が一部利用者において発生。  
対応を検討し、3/17周知の上、版数を一時的に変更する対応を実施。（事象は解消）
